

（仮称）大島ウェルカム・ターミナル整備事業 造成工事の進捗状況について


1 造成工事完了時期の遅れ

- （仮称）大島ウェルカム・ターミナル（以下「WT」という。）敷地内の一部箇所の盛土工事において、地盤沈下の収束安定に時間がかかる見通しとなり、2月末としていた造成工事完了時期に遅れが生じることとなりました。
- 当該箇所の地盤沈下の収束については、昨年秋、市としては短期間に集中的に盛土を行うことで地盤沈下が促進されるというぎりぎりの想定に基づき工程の見直しを行いました。今般、同敷地内で盛土が規定高まで達している他区域の沈下収束の解析結果がまとまり、それに基づき当該箇所の地盤沈下期間を推計したところ、無対策の場合、3か月程度の遅れが避けられないと判断するに至ったところです。
- 今回の遅れについては、市の工程管理の甘さを痛感しており、民間商業施設の運営予定者の皆様をはじめ、市民の皆様にも深くお詫び申し上げます。

2 今後の対応

- 当該箇所の盛土工事の一日も早い完了を目指し、現在、地盤の早期安定を図るための対策工の追加などを検討しております。
- 民間商業施設事業予定地については、運営予定者の皆様への連絡を丁寧に行い、ご理解を得ながら早期引き渡しを目指してまいります。
- 今回の遅れは、年内完成を目指してきたWT全体にも影響するため、遅れを最小限にとどめたいと考えております。今後の沈下収束や対策工の状況を踏まえながら、見通しがつき次第、関係者や地元の皆様にお知らせしてまいります。

3 今後の全体工程（想定スケジュール）

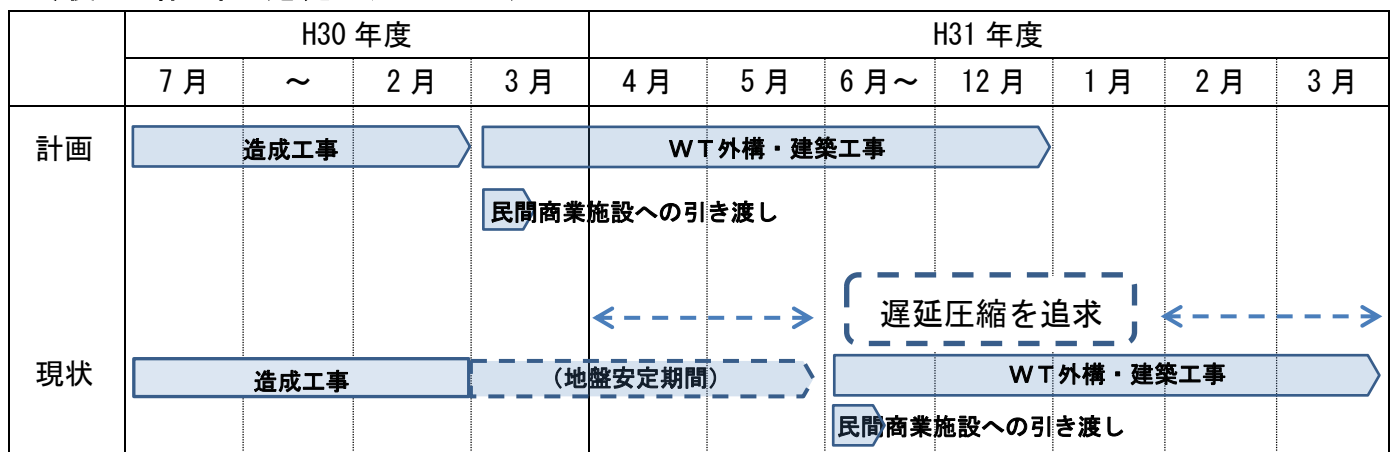

※当該工程表は不確定要素があるため、今後変更があり得る。適時、見直しを行っていく。

4 WT全体完成予定時期の経過

発表時期	WT全体完成予定時期
（当初）	平成 31 年 3 月
平成 29 年 11 月	平成 32 年 6 月
平成 30 年 3 月	平成 31 年 12 月
平成 31 年 2 月	（3か月程度の遅れの可能性）

■■■■■ WT 事業区域

———— 盛土工事遅延区域

工事現場
(平成 31 年 1 月 14 日 撮影)



WT 事業区域

盛土工事遅延区域

