

## 漁港の復旧整備の進捗状況について

## 1 市管理漁港の漁港施設災害復旧事業及び進捗状況

東日本大震災で漁港施設全体の沈下や流失等，市管理漁港のほぼ全ての施設が甚大な被害を受けたことから，国の災害復旧事業により平成23年度においては泊地航路の瓦礫撤去，平成24年度からは3ヶ年計画で漁港施設の復旧工事を進めている。

工事発注については，平成24年度は主要8漁港の施設17件を4工事として，平成25年度には30漁港の施設174件を4工事とし競争入札により発注し，併せて8工事として全ての工事発注を終えている。

工事の着手にあたっては，漁港利用者や県漁協との協議を踏まえ，物揚場等の荷揚げ施設を優先し，順次，護岸や防波堤等に着手している。全体の進捗率は6月末で漁港施設のない神止浜漁港を除く30漁港全体で進捗率43%（施工箇所の平均）となっている。

今後とも，工事に伴う仮係船場所の確保や養殖施設の移設などについて地元と調整すると共に，岸壁等の復旧高さや工法変更に伴う国・県との協議を進めて工事の進捗を図り，年度内完成を目指していく。

## 〈市管理漁港の災害復旧工事〉

年度	工事の内容	施工箇所	契約状況	進捗
23	泊地航路の瓦礫撤去	17漁港	済み	完了
24	漁港施設の災害復旧	8漁港 17施設	〃	完了
25	〃	30漁港174施設	〃	施工中
		30漁港191施設		完成率 27/191=14.1%

## 2 県管理漁港の復旧整備の進捗状況


県が管理する7漁港の施設157件については，平成23年度から復旧工事に着手し，平成27年度末の完成を目指し工事を進めている。

6月末の工事の進捗状況については，発注率63.7%，進捗率50.0%，完成率18.5%と伺っている。



# 平成23年災 漁港施設災害復旧工事 位置図

①	第一種漁港	31港
②	第二種漁港	6港
③	特定第三種漁港	1港
④	漁業用施設	6施設

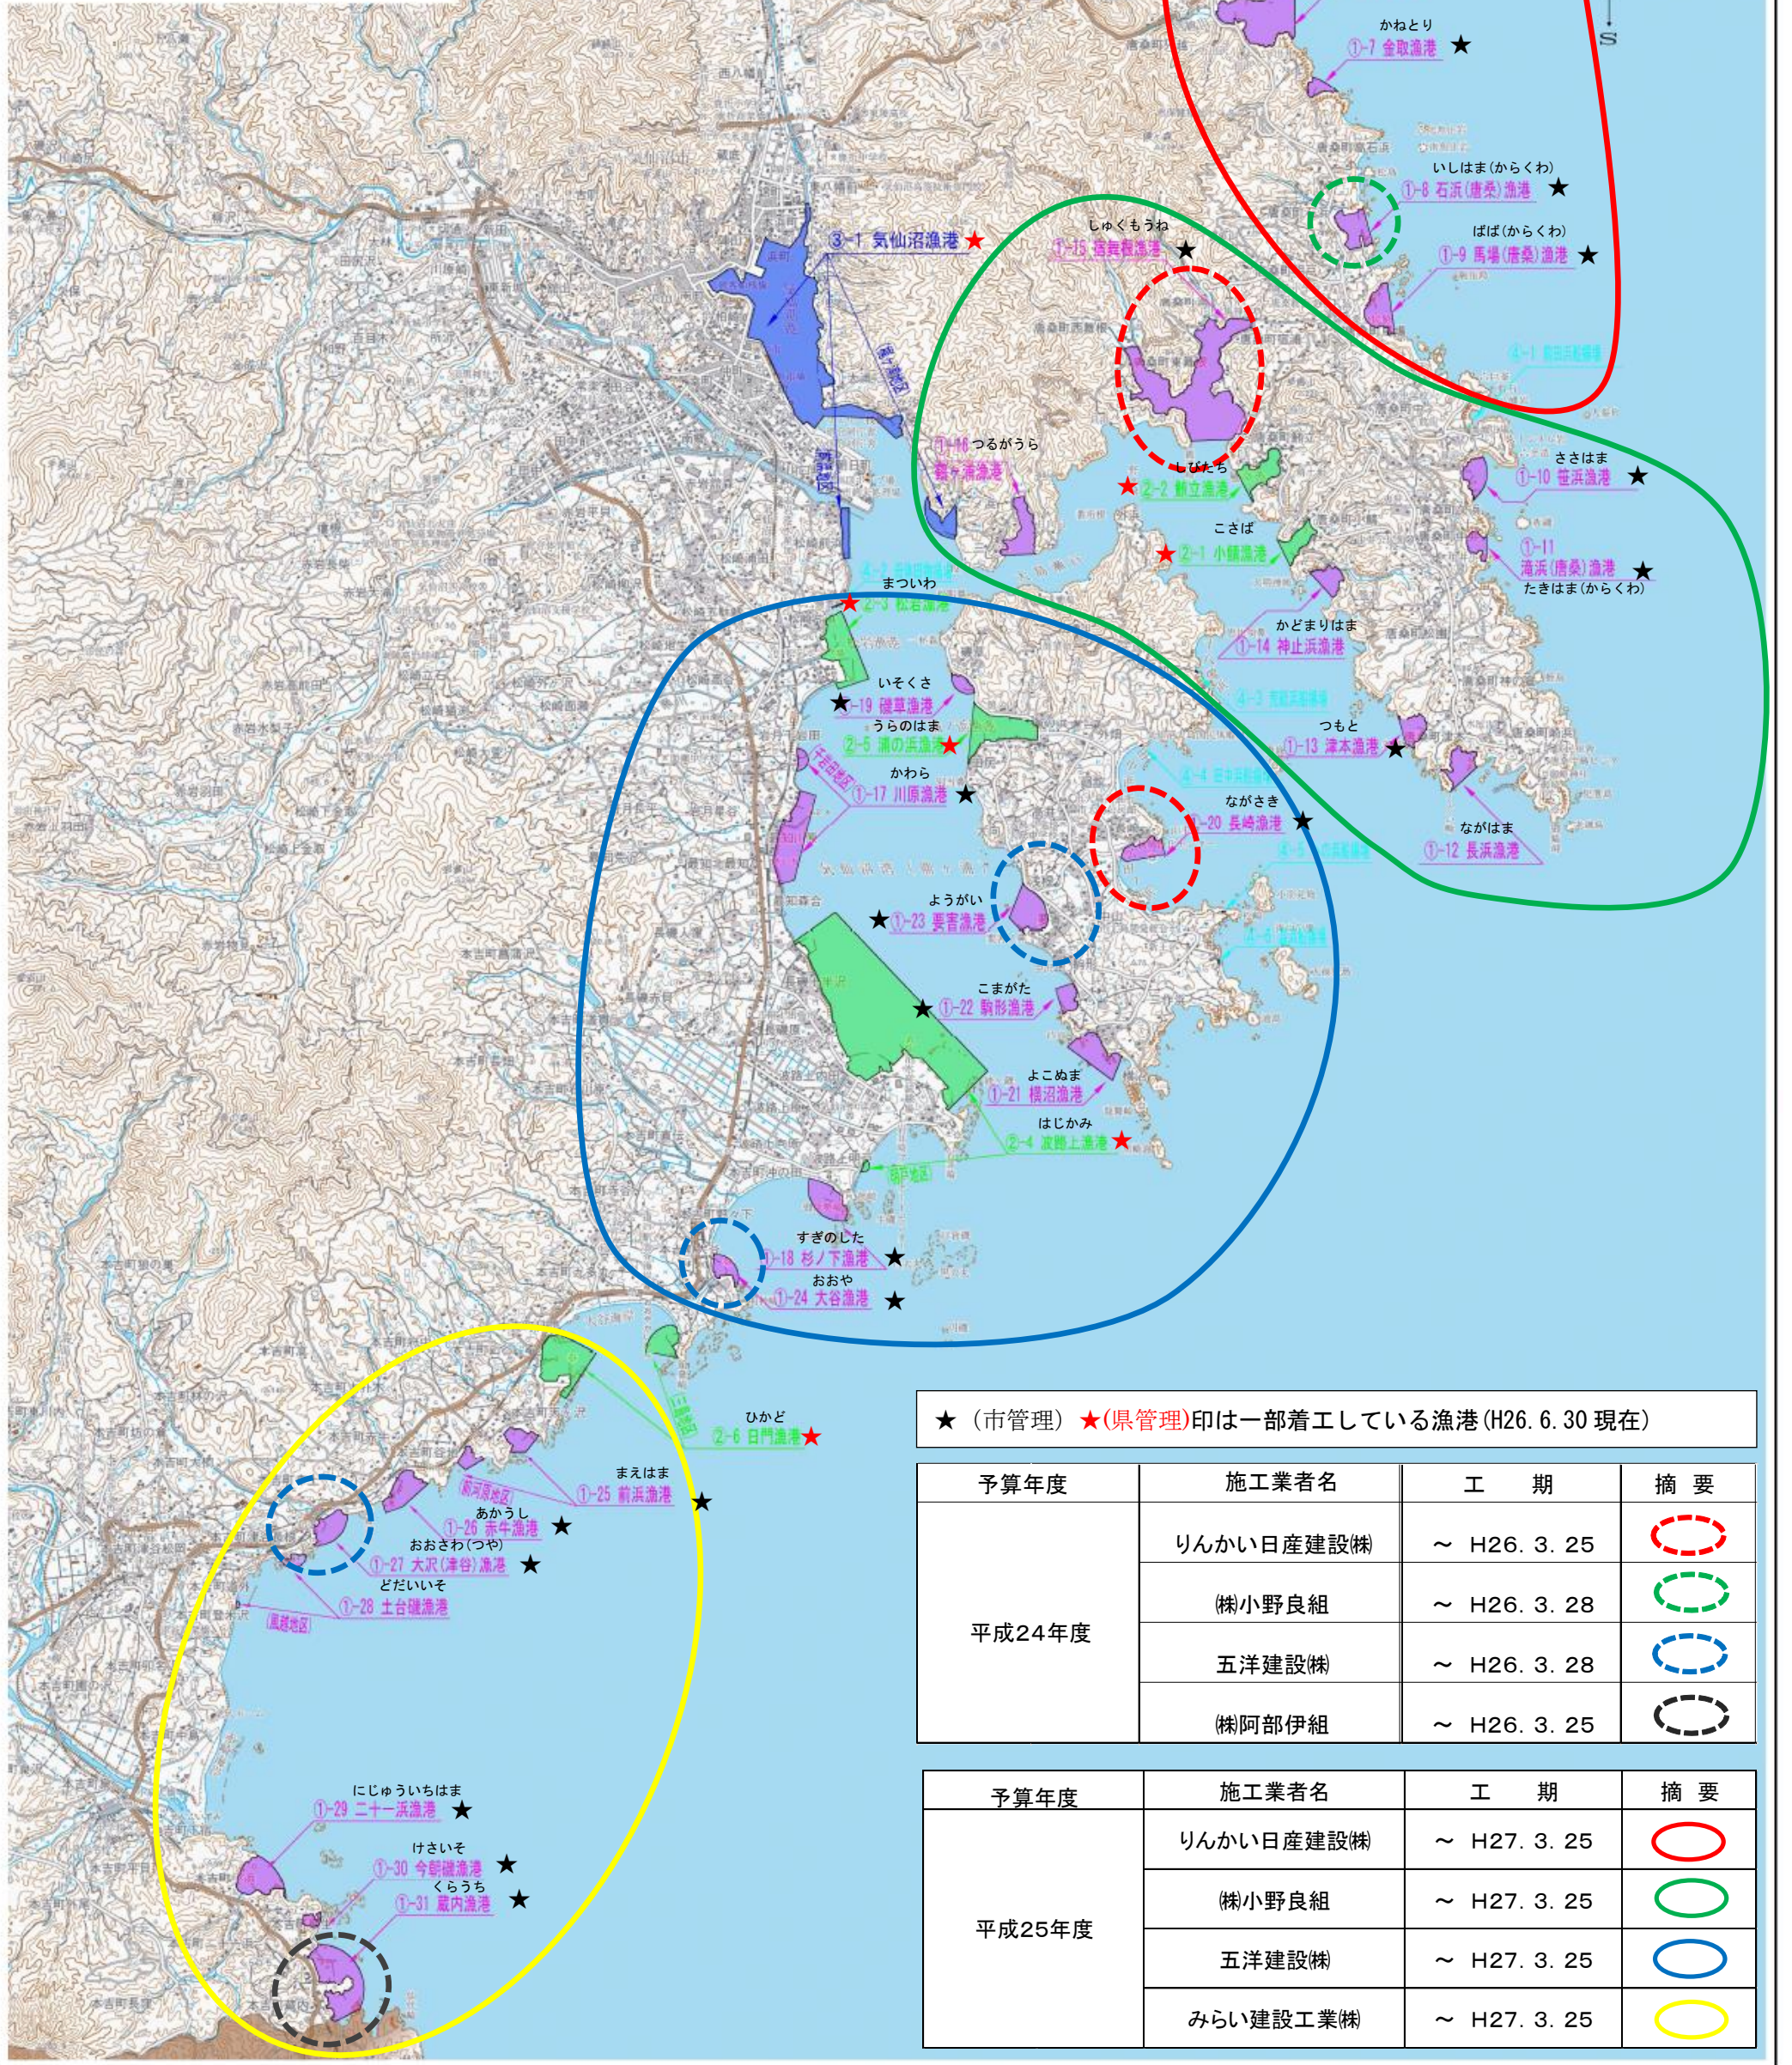

★(市管理) ★(県管理)印は一部着工している漁港(H26.6.30現在)

予算年度	施工業者名	工期	摘要
平成24年度	りんかい日産建設(株)	～ H26. 3. 25	①-1 大沢(唐桑)漁港
	(株)小野良組	～ H26. 3. 28	①-2 館漁港
	五洋建設(株)	～ H26. 3. 28	①-3 岩井沢漁港
	(株)阿部伊組	～ H26. 3. 25	①-4 飯釣漁港

予算年度	施工業者名	工期	摘要
平成25年度	りんかい日産建設(株)	～ H27. 3. 25	①-5 小田浜漁港
	(株)小野良組	～ H27. 3. 25	①-6 只越漁港
	五洋建設(株)	～ H27. 3. 25	①-7 金取漁港
	みらい建設工業(株)	～ H27. 3. 25	①-8 石浜(唐桑)漁港



# 漁港施設災害復旧工事進捗状況(市管理)

H26.6.30現在

NO	漁港名	施工業者	施工箇所	進捗率	備考
1	大沢(唐桑)漁港	りんかい日産建設	大沢北防波堤外	32%	H25年度工事
		りんかい日産建設	突堤、物揚場	100%	H24年度工事
2	館漁港	りんかい日産建設	館防波堤外	15%	H25年度工事
3	岩井沢漁港		防波堤外	36%	
4	載鈎漁港		載鈎防波堤外	15%	
5	小田浜漁港		小田浜防波堤外	77%	
6	只越漁港		只越物揚場外	24%	
7	金取漁港		沖防波堤外	25%	
8	石浜(唐桑)漁港		石浜北防波堤外	24%	
			小野良組	石浜南防波堤、物揚場	
9	馬場(唐桑)漁港	りんかい日産建設	馬場防波堤外	51%	H25年度工事
10	笹浜漁港	小野良組	笹浜護岸、笹浜突堤外	55%	H25年度工事
11	滝浜(唐桑)漁港		滝浜突堤、防波堤外	30%	
12	長浜漁港	小野良組	船揚場外	0%	H25年度工事
13	津本漁港	小野良組	津本防波堤外	40%	H25年度工事
14	神止浜漁港				漁港施設無し(海岸施設着手)
15	宿舞根漁港	小野良組	北古館道路宿物揚場外	10%	H25年度工事
		りんかい日産建設	北古館物揚場、護岸	100%	H24年度工事
16	鶴ヶ浦漁港	小野良組	物揚場外	0%	H25年度工事
17	川原漁港	五洋建設	川原南防波堤、台ノ沢南物揚場外	40%	H25年度工事
18	杉ノ下漁港		杉ノ下護岸、杉ノ下物揚場外	38%	
19	磯草漁港		防波堤、護岸外	40%	
20	長崎漁港		臨港道路、物揚場外	30%	
		りんかい日産建設	防波堤、護岸、物揚場	100%	H24年度工事
21	横沼漁港		船揚場外	5%	H25年度工事
22	駒形漁港	五洋建設	駒形物揚場外	68%	
23	要害漁港		浅根物揚場外	42%	
		五洋建設	要害防波堤、護岸、要害物揚場	100%	H24年度工事
24	大谷漁港	五洋建設	大谷物揚場外	40%	H25年度工事
		五洋建設	向山防波堤、護岸、向山物揚場	100%	H24年度工事
25	前浜漁港		東物揚場、前河原物揚場外	35%	H25年度工事
26	赤牛漁港	みらい建設工業	三角岩防波堤、南護岸外	30%	
27	大沢(津谷)漁港		防波堤外	20%	
		五洋建設	橋本前防波堤、コナ崎防波堤、橋本前物揚場、取付護岸	100%	H24年度工事
28	土台磯漁港	みらい建設工業	船揚場外	0%	H25年度工事
29	二十一浜漁港		北防波堤外	20%	H25年度工事
30	今朝磯漁港	みらい建設工業	防波堤外	5%	
31	蔵内漁港		船揚場外	5%	
		阿部伊組	蔵内物揚場、防波堤	100%	H24年度工事
<b>全体</b>				<b>43%</b>	
